





**ATA DE VISTORIA DO PROTÓTIPO
APRESENTADO PELA EMPRESA
RD MÓVEIS LTDA**

Às dezesseis horas do dia onze de setembro de dois mil e seis, na presença do Senhor LUIZ GOMES MARQUES, Diretor do Serviço de Engenharia e do Arquiteto ANTÔNIO NICOLAU BRANDÃO, Assessor da Presidência, foram analisados os protótipos apresentados pela empresa RD MÓVEIS LTDA., referente ao objeto do Pregão Eletrônico PE22/2006, cujo objeto é a aquisição para complementação das estações de trabalho padrão existentes na Nova Sede. Os fiscais verificaram que os protótipos encontravam-se montados, apresentando desconformidades com relação às especificações técnicas apontadas no relatório fotográfico em anexo.


Com base no descumprimento das exigências constantes do edital, a Fiscalização conclui pela não aprovação do protótipo apresentado pela empresa RD MÓVEIS LTDA.

Brasília, 13 de setembro de 2006.


ANTÔNIO NICOLAU BRANDÃO
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - TST


LUIZ GOMES MARQUES
Diretor SRENG - TST

274
801

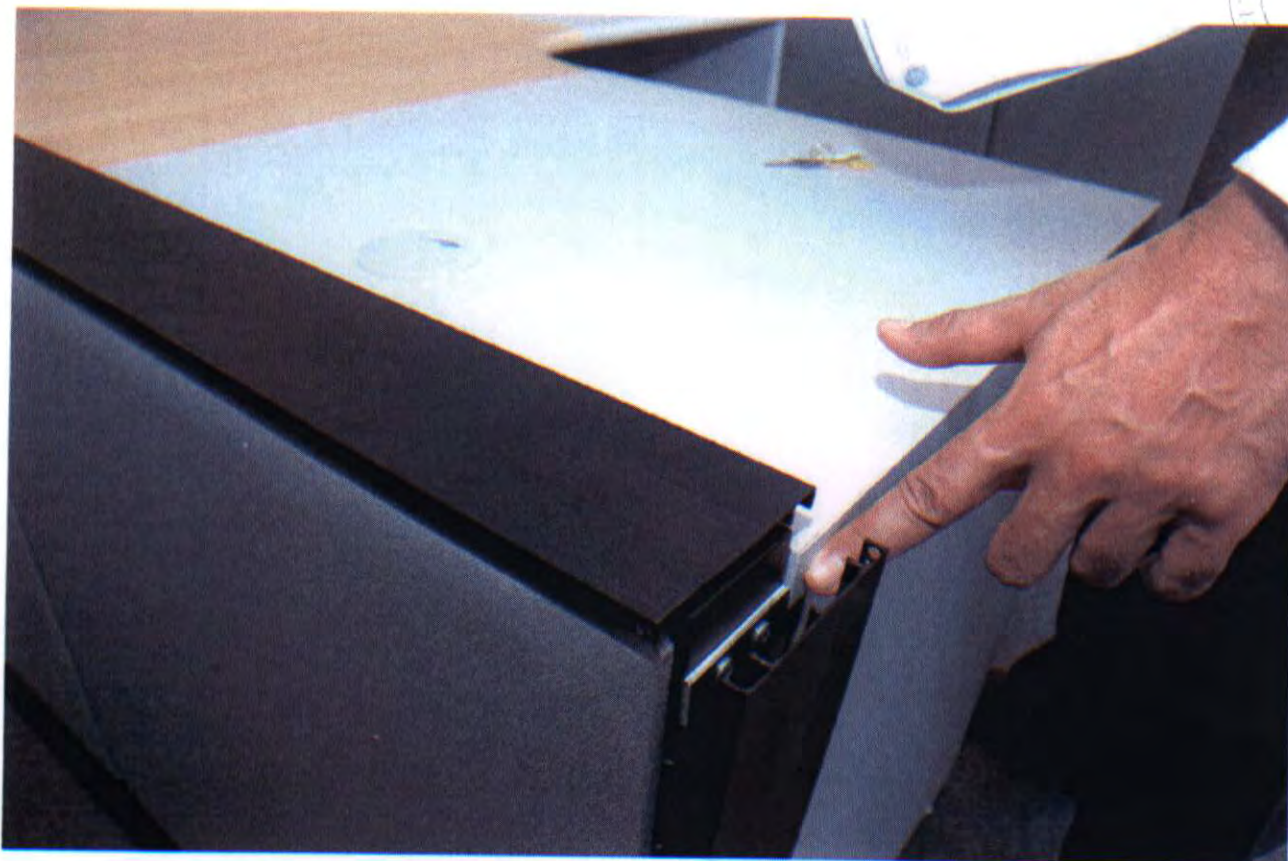


As réguas de fechamento superior e lateral não fecham pois são diferentes da largura da estrutura.




Há um desnível significativo entre as superfícies de trabalho e a estrutura (régua) nas estações D1 e C1, não admitidos nos projetos executivos.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

SERV. 275
02-8

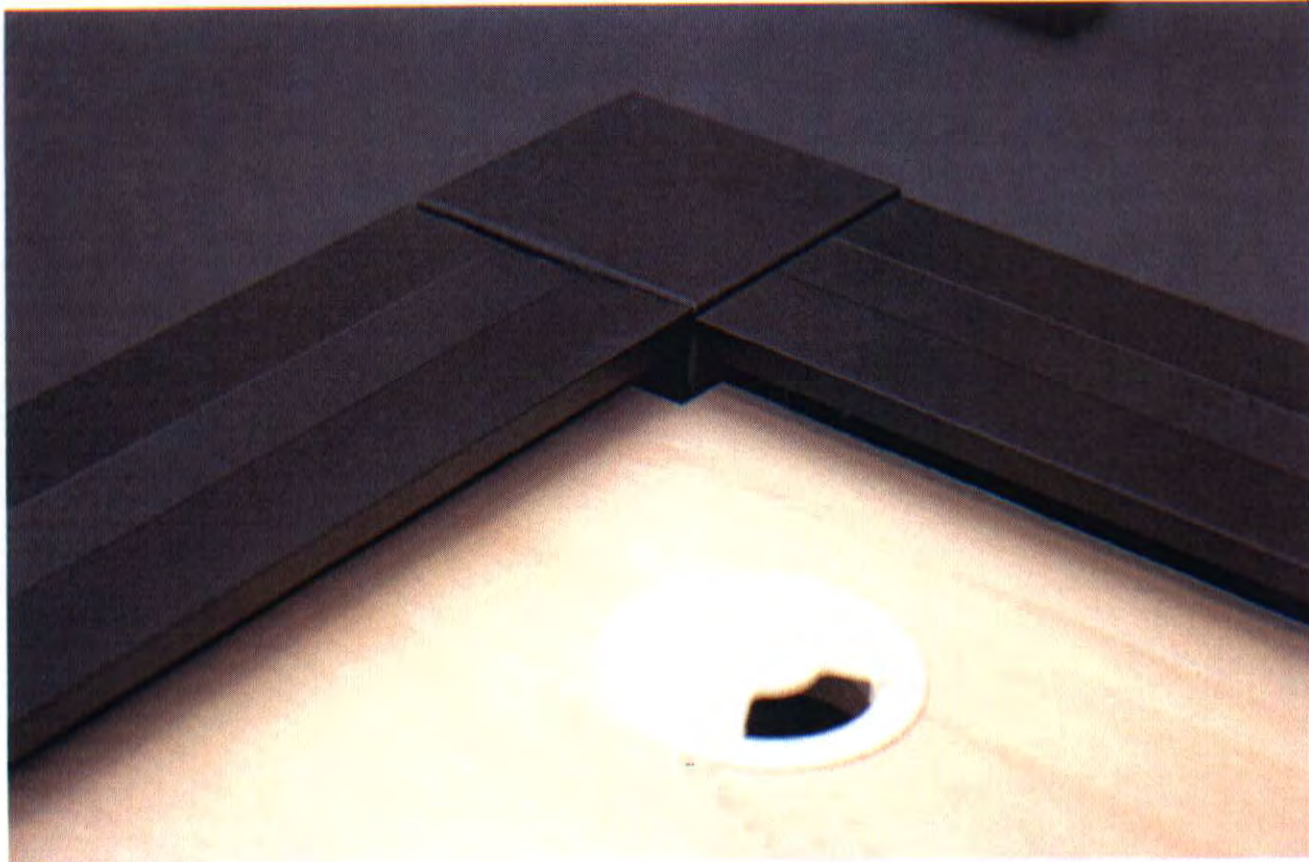

Por conta da diferença entre as rféguas e a estrutura, as superfícies de trabalho, receberam um corte não previsto em projeto.

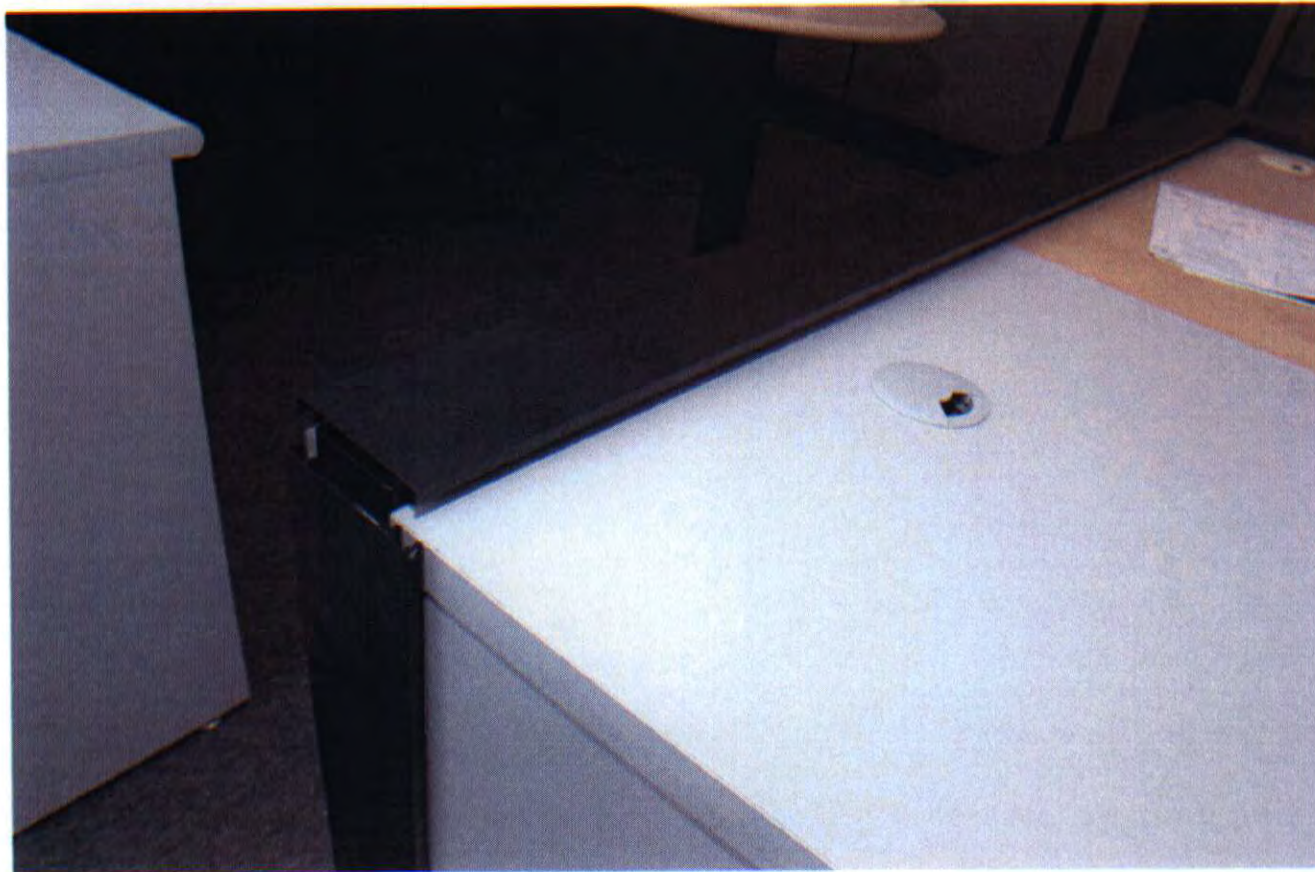


Acabamento de réguas estrutura e superfície de trabalho totalmente insatisfatório.

[Handwritten signature]



A estação D1 tem todo o seu tampo em laminado cinza. Não há laminado fantasia pau-marfim.

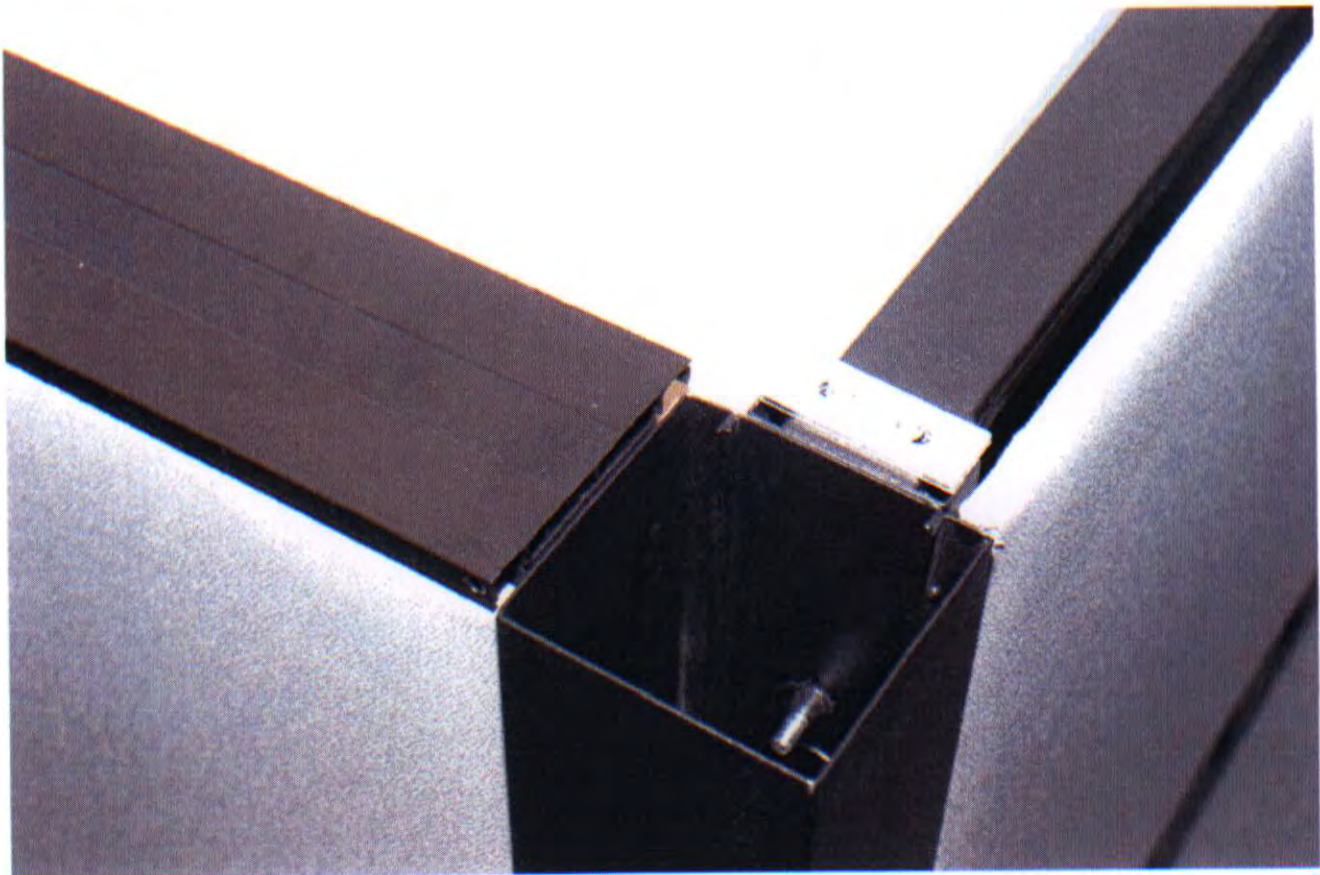

A especificação diz estrutura "confeccionada em alumínio estrudado - não atendido.

[Handwritten signature]

211
Ø



Acabamento não atende especificação quanto a quinas vivas e/ou cortantes e a cor. Detalhe totalmente fora da especificação.



Especificação exige solda com boa qualidade. Não aceitar-se-iam soldas grosseiras.


278
A
105-



Proibido peças cortantes.



Deveria existir bandeja em poliuretano com divisões para utensílios (lâpis, cliques etc). Uma unidade por gaveteiro..

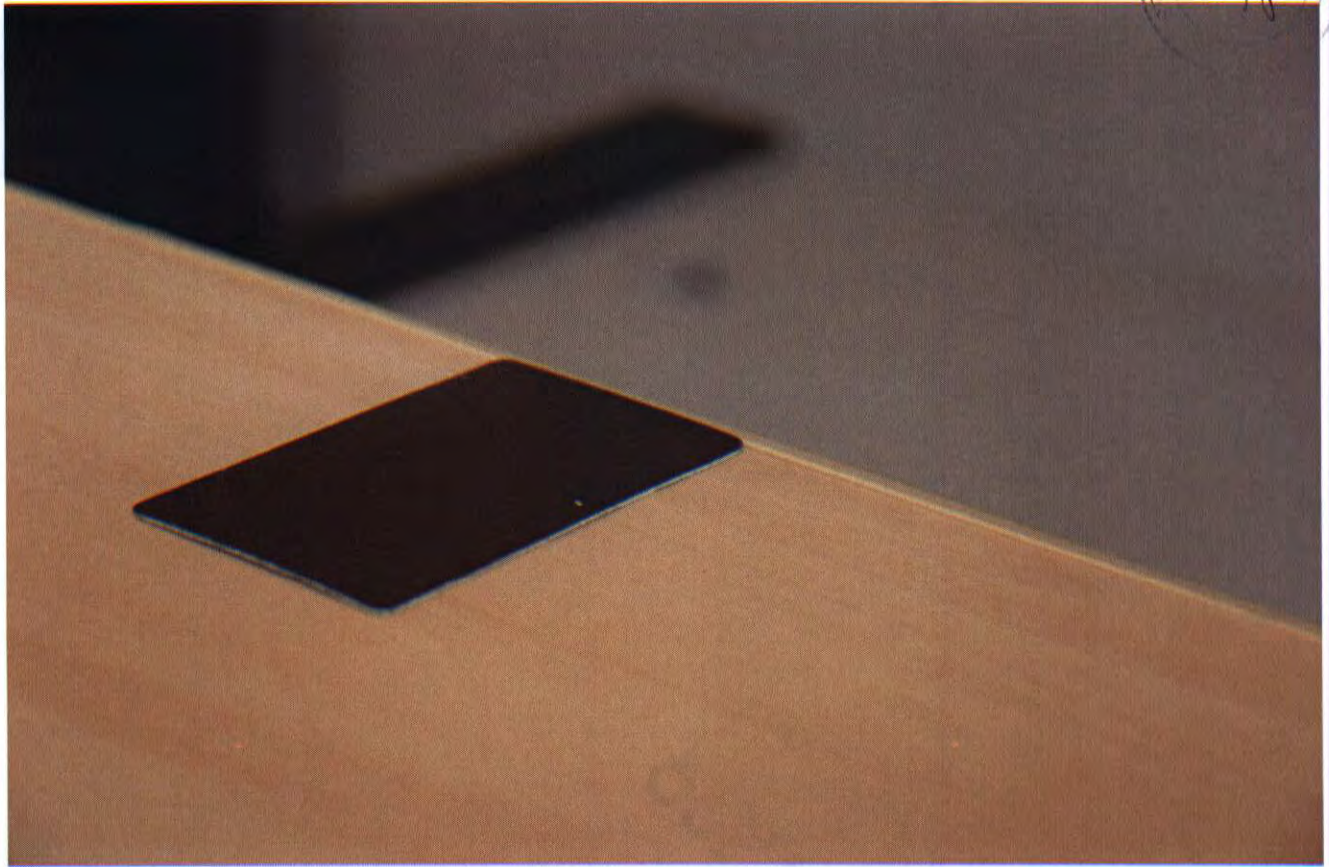


Não é admitido na especificação nenhum desnível entre a superfície de trabalho e o acabamento em PVC.




Idem

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes.

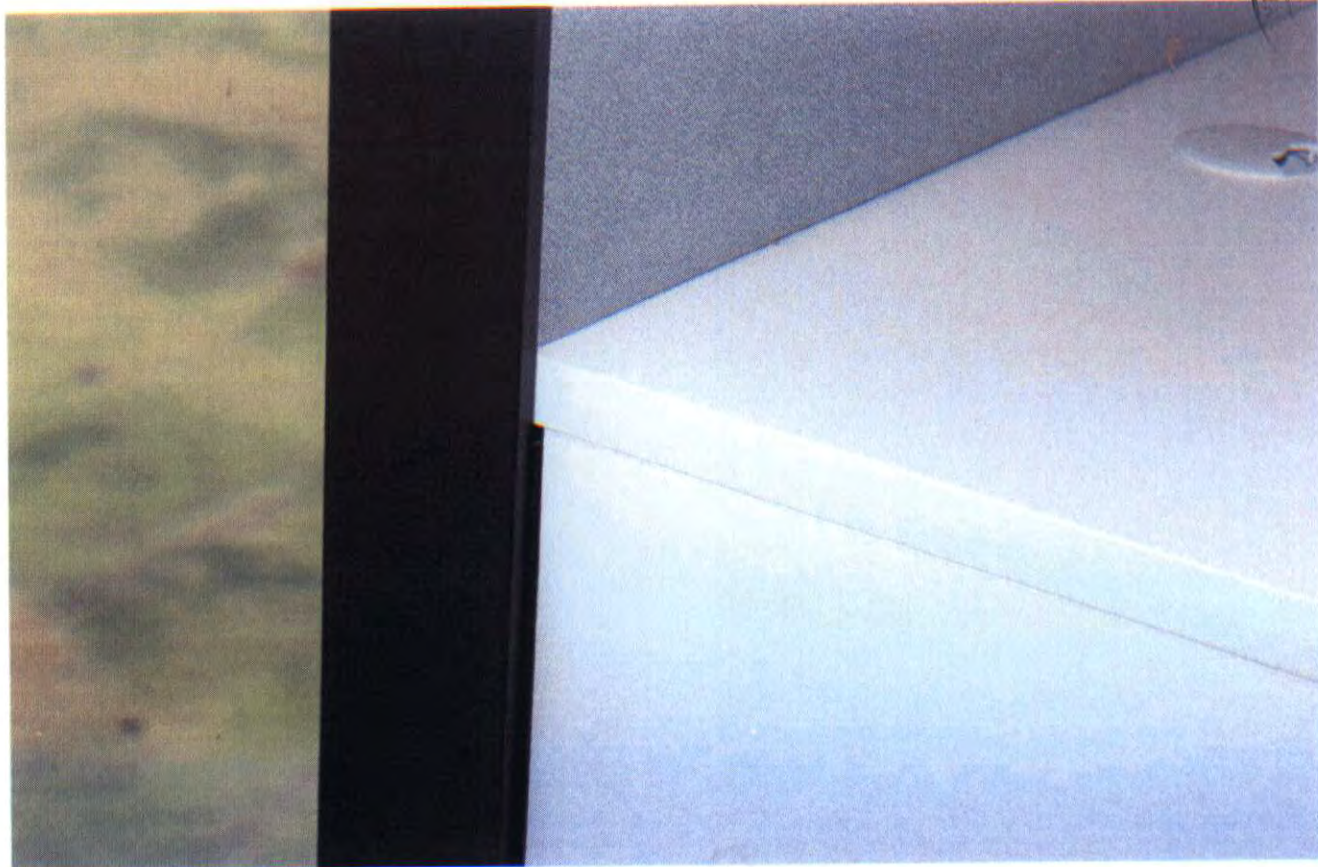

A profundidade do fechamento lateral está menor que a superfície de trabalho, deixando uma fresta, o que a especificação não permite.

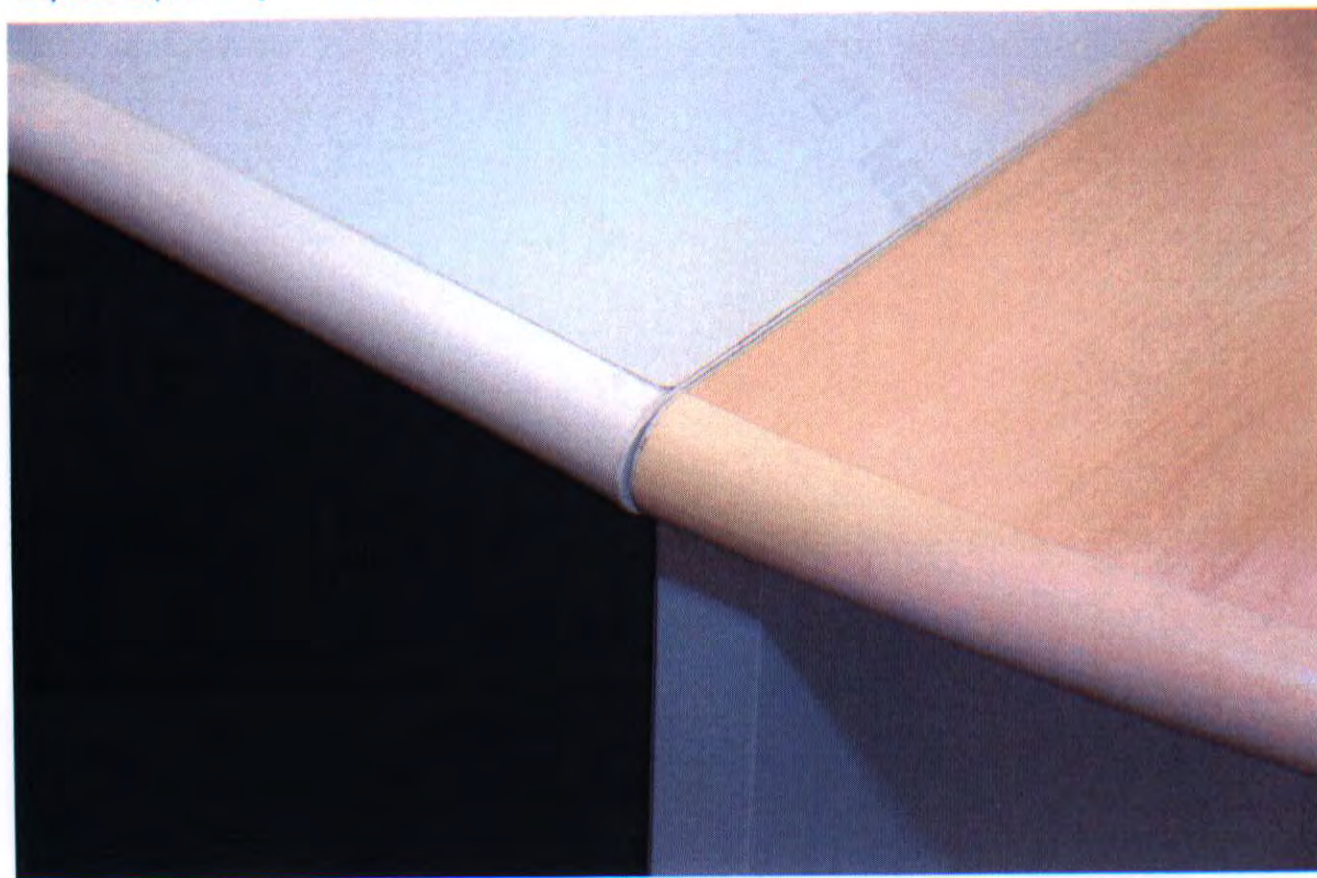

Não é permitido desencontros entre as diversas peças.

[Handwritten signature]

TO DE
23/08
Ø



Idem



Idem

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is located in the bottom right corner of the page.

282
18
-09-




A fechadura do gaveteiro é fumê e no canto oposto ao do usuário, junto a lateral de fechamento.




O laminado está com corte e aplicação grosseiros, dando acabamento esbeijado.

[Handwritten signature]

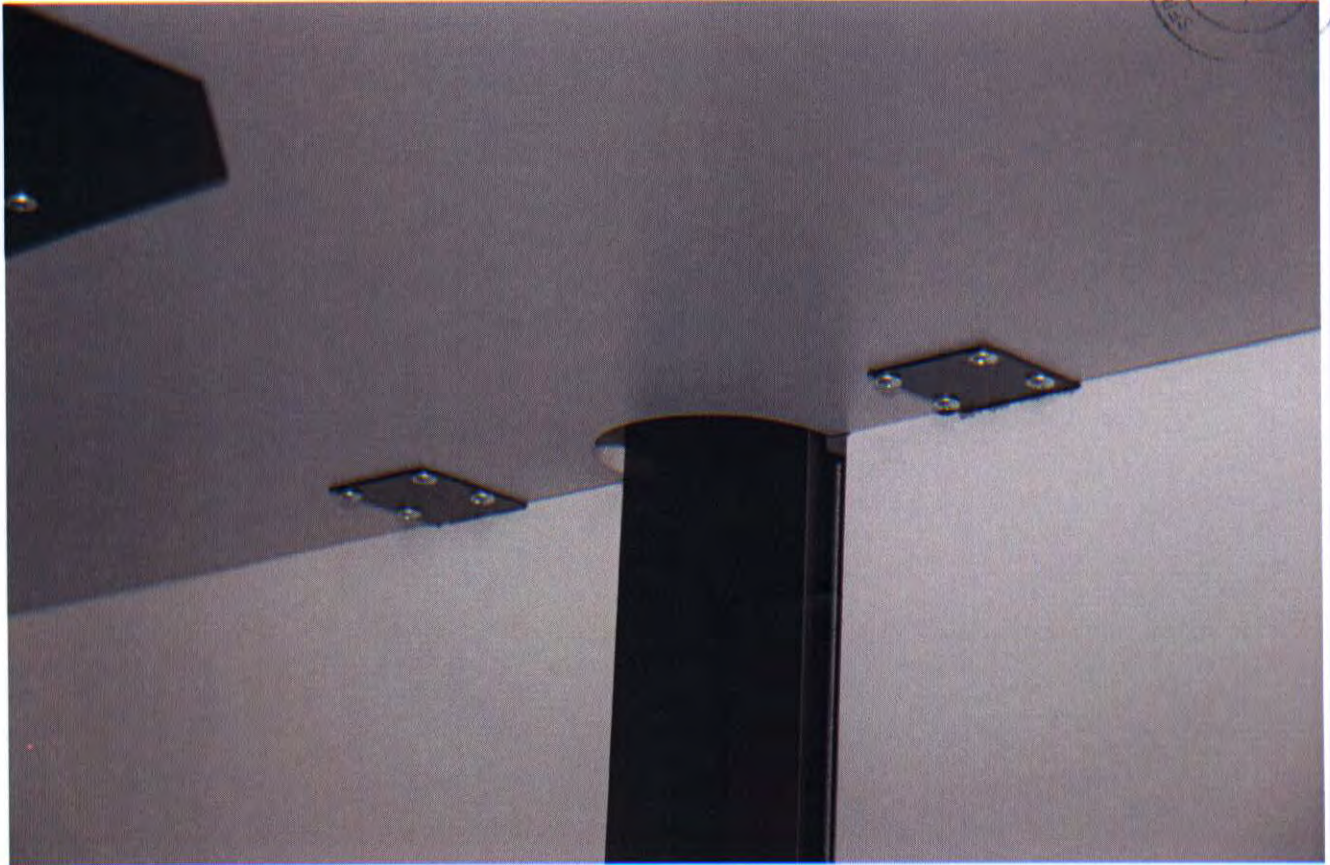


O acabamento do travamento entre as superfícies de trabalho e o tampo redondo está muito ruim.

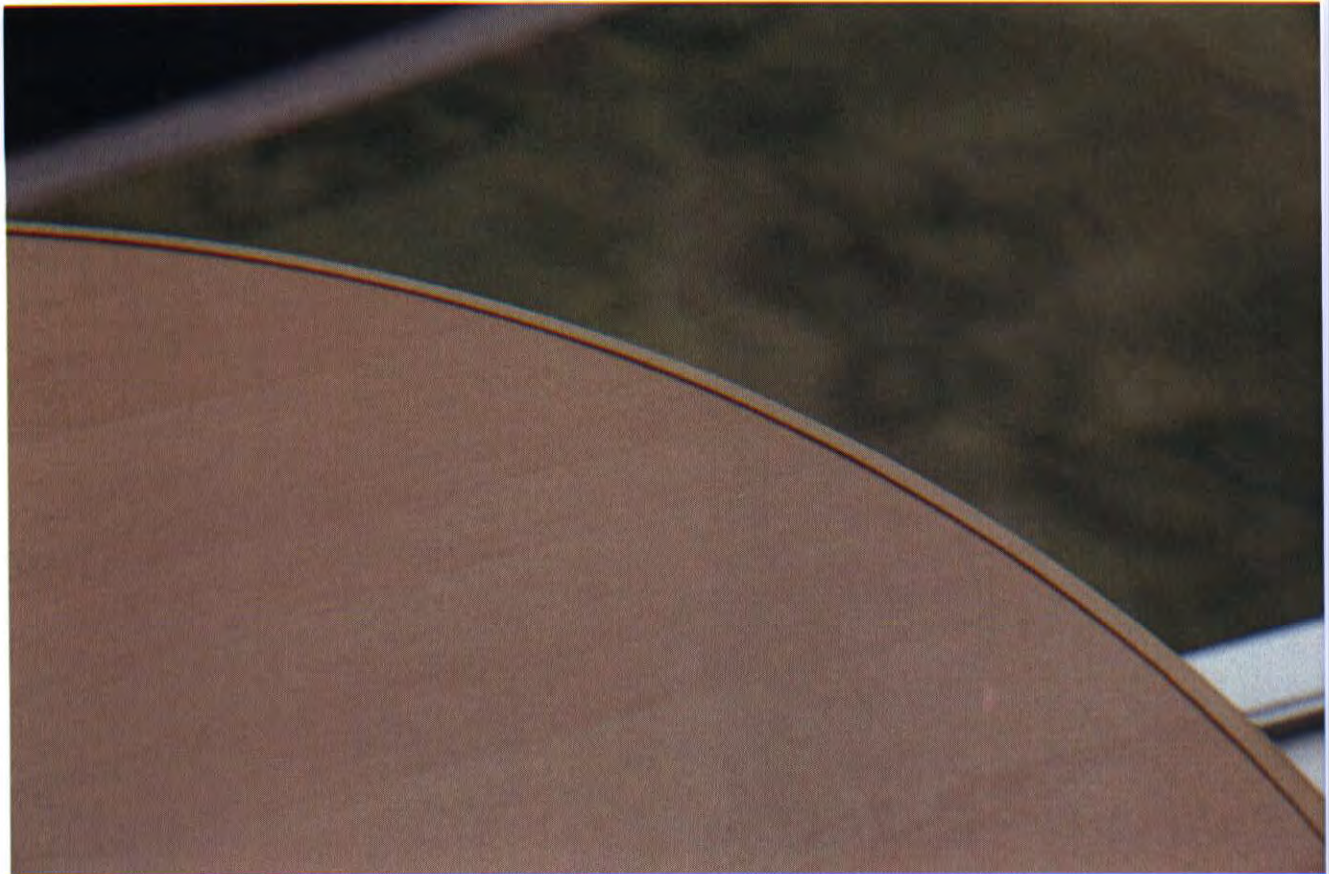

Desnível não admitido entre tampo e acabamento em PVC.

[Handwritten signature]

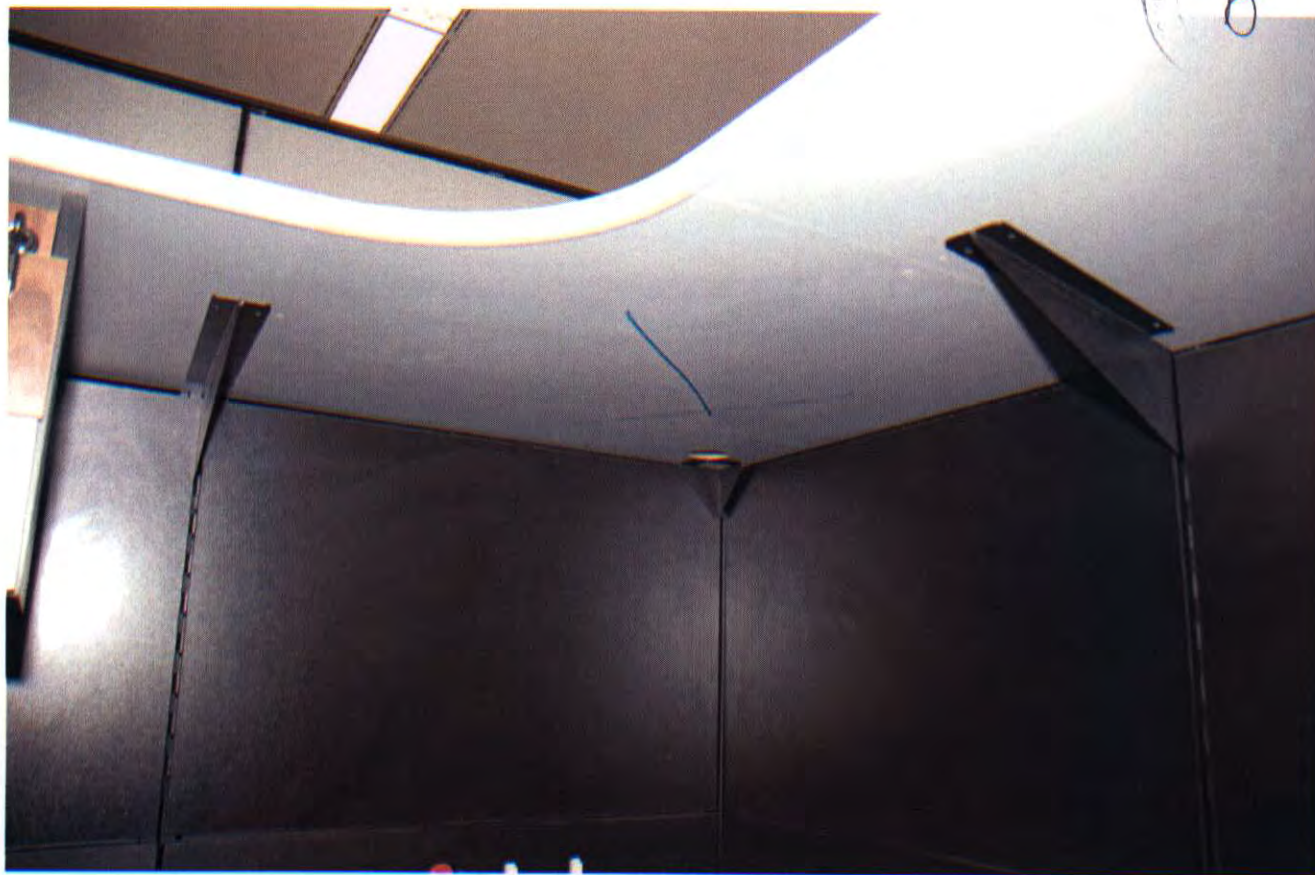


As mãos francesas não estão fixadas ao tampo..




Acabemnto muito ruim entre as régua laterais e superiores..

Handwritten signature in blue ink.

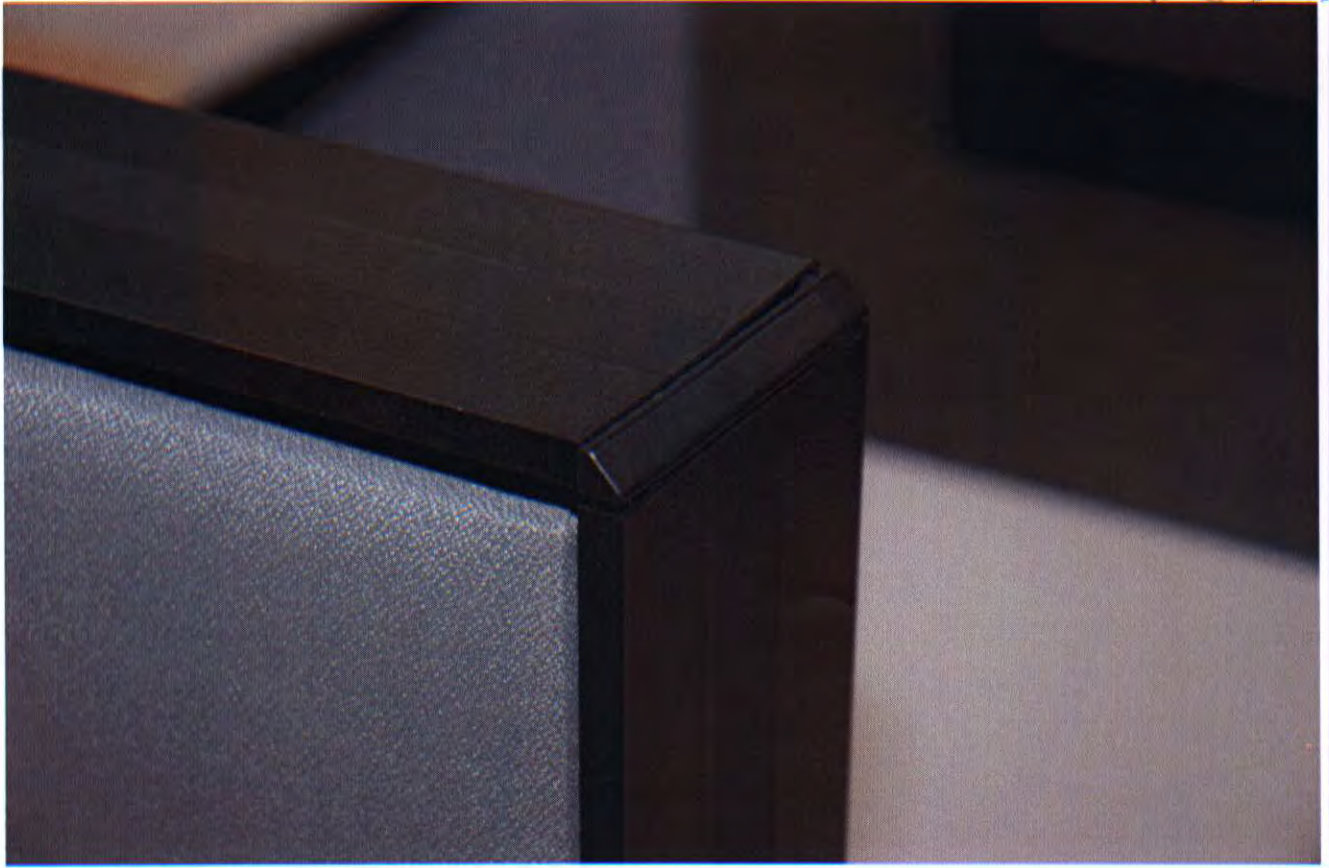

Idem.

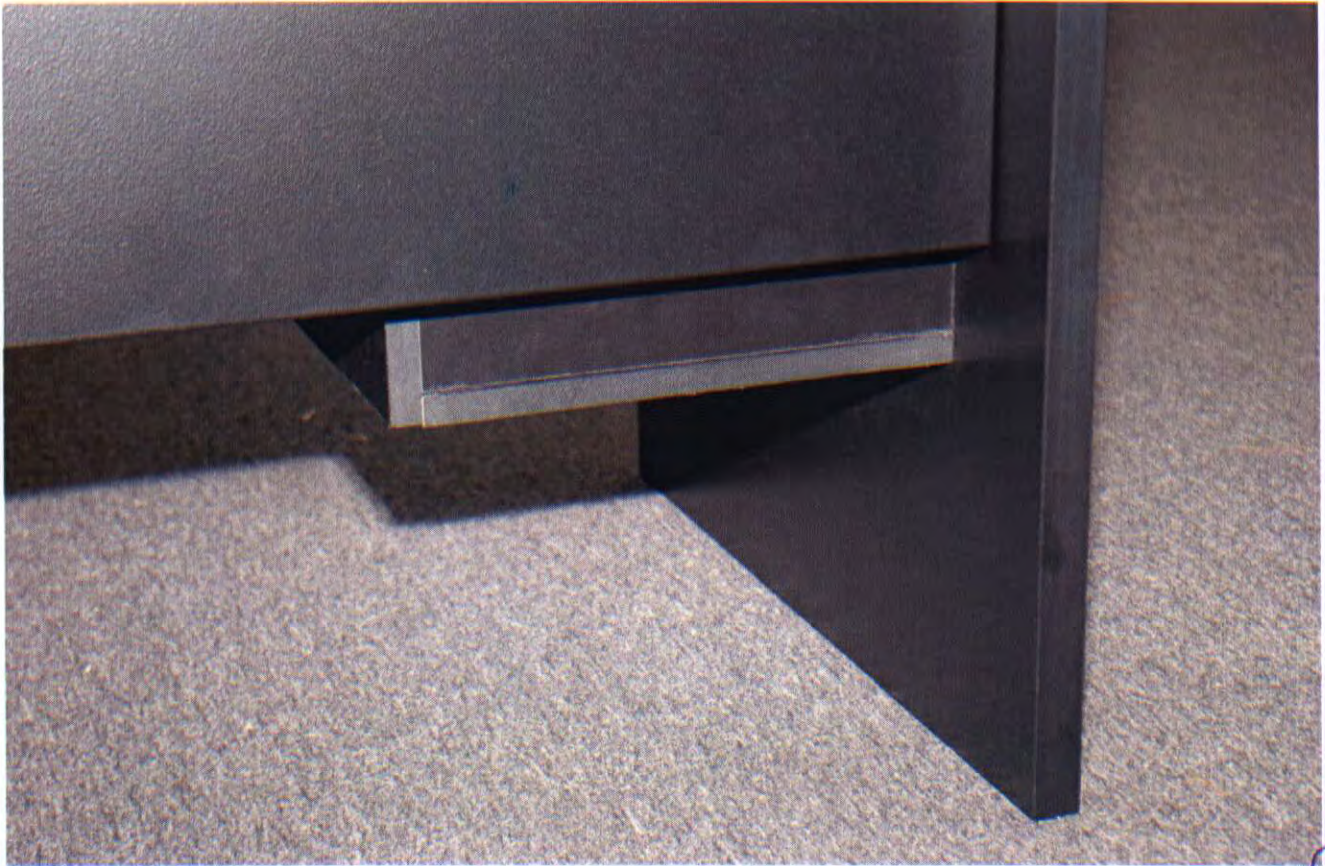

Gaveteiro maior que a saia, em desacordo com o projeto executivo..

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located at the bottom right of the page.

206
18

13-



Falta fechadura nos gaveteiros das estações e postos de trabalho de assessores.



A estação da recepcionista está com painéis em tamanhos diferentes, em desacordo com o projeto executivo.

A handwritten signature in blue ink, followed by several large, sweeping scribbles in blue and red ink.



O acabamento em ipê deveria estar visível em todo o perímetro da porta, não está acontecendo pois as portas dos armários suspensos estão maiores do que o especificado.

A handwritten signature in blue ink, followed by a large blue arrow pointing downwards and to the left.
